

# 水量平衡测试整改意见函

上村铁塔工业园：

大湾区检测(深圳)有限公司于2022年10月20日在经贵公司相关工作人员陪同下进行水量平衡测试现场勘查。

根据水量平衡测试要求，掌握单位用水现状，如水系官网分布情况，各类用水设备、设施、仪器、仪表分布及运转状态，用水总量和各单元的定量关系，获取准确数据，经贵公司相关工作人员和我司工作人员在现场了解，发现不满足水量平衡测试条件有：

- 1、A1 冷却塔缺少补水计量水表。
- 2、A2 冷却塔缺少补水计量水表。
- 3、B6 万鸿盛冷却塔缺少补水计量水表。

不满足测试条件依据标准有：①《单位用户水量平衡测试技术指南》SZDB/Z 34—2011“表 C.20 单位用户节水情况表”考核指标间接冷却水循环率 $\geq 95\%$ 。②《企业水平衡测试通则》GB/T12452-2022标准规定需计算企业用水重复利用率和间接冷却水循环率。

要满足完成水量平衡测试，请按以下我方提出的意见进行整改。


发函公司名称：大湾区检测(深圳)有限公司

联系方式：15798471007

日期：2022年10月22日

### 修改意见:

1、A1 栋厂房的东侧恒塑冷却塔、北侧万鸿盛冷却塔和楼顶各公司使用的冷却塔进水管上加装水表，共 5 块表（如下图所示）。

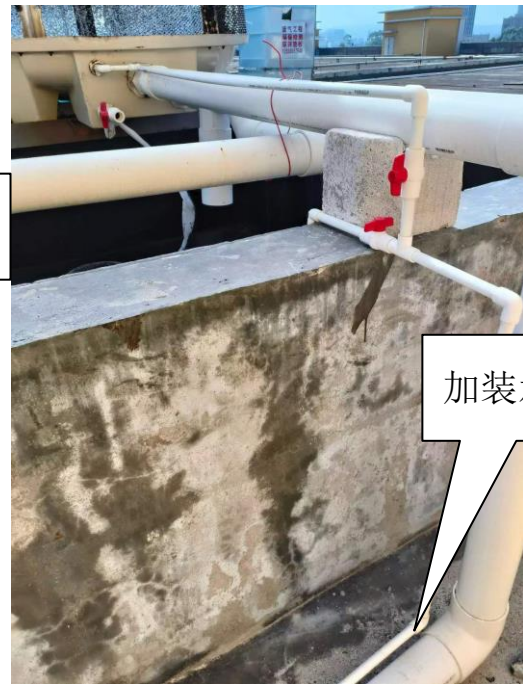

2、A2 栋厂房楼顶的航连通冷却塔自来水补水管上加装计量用水表  
(见下图所示)。



加装水表

3、B6 栋厂房楼顶万鸿盛冷却塔自来水补水管上加装计量用水表 (见  
下图所示)。



加装水表
